

Project-plan-v0.1

Η διαθεσιμότητα και ο μισθός των μελών της ομάδας για το έργο:


Υπάλληλος	Μέλος	Προηγούμενη Εμπειρία (Κατηγορία)	Ποσοστό Συμμετοχής (διαθεσιμότητα)	Μισθός (ευρώ/ανθρωπομήνα)
A	Ερμής	Άπειρος	100%	800 €
В	Ηλίας	Άπειρος	100%	800 €
Γ	Γιώργος	Άπειρος	100%	800 €
Δ	Σπύρος	Άπειρος	100%	800 €

Υποέργο	Περιγραφή
TY1	Πρώτη επαφή με το δήμο / Μελέτη Υλοποίησης
TY2	Συλλογή αδειών και συνεργασία με εταιρίες
TY3	Σχεδιασμός UI/UX
TY4	Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων
TY5	Υλοποίηση UI/UX
TY6	Δεύτερη επαφή με το δήμο
TY7	Σχεδιασμός υποσυστήματος αναπαράστασης και κατάταξης προβλημάτων για χρήστη
TY8	Σχεδιασμός υποσυστήματος αναπαράστασης και κατάταξης προβλημάτων για διαχειριστή
TY9	Σχεδιασμός και ανάπτυξη βάσης δεδομένων
TY10	Ανάπτυξη υποσυστήματος αναπαράστασης και κατάταξης προβλημάτων για χρήστη

TY11	Ανάπτυξη υποσυστήματος αναπαράστασης και κατάταξης προβλημάτων για διαχειριστή
TY12	Τριτη επαφή με τον Δήμο
TY13	Σχεδιασμός όλων των υποσηστημάτων της εφαρμογής
TY14	Σχεδιασμός και ανάπτυξη βάσης δεδομένων
TY15	Ανάπτυξη όλων των υποσηστημάτων της εφαρμογής
TY16	Έλεγχος συστήματος και Debugging
TY17	Τέταρτη επαφή με το Δήμο
TY18	Παρουσίαση συστήματος στον Δήμο
TY19	Αξιολόγηση από το Δήμο
TY20	Αποδοχή από το Δήμο
TY21	Εγκατάσταση συστήματος

Τυπικά Υποέργα	Προαπαιτούμενα Υποέργα	Κανονική εκτίμηση (σε ημέρες)	Αισιόδοξη εκτίμηση (σε ημέρες)	Απαισιόδοξη εκτίμηση (σε ημέρες)
TY1	-	7	6	17
TY2	TY1	5	3	10
TY3	TY1	6	4	15
TY4	TY3	6	4	15
TY5	TY3	9	7	16
TY6	TY4,TY5	6	5	12
TY7	TY6	6	5	10
TY8	TY6	6	5	10
TY9	TY7, TY8	8	7	15
TY10	TY9	9	7	20
TY11	TY9	10	8	20
TY12	TY10,TY11	6	5	12
TY13	TY12	6	5	10
TY14	TY13	6	5	10
TY15	TY14	8	7	15
TY16	TY15	12	10	30
TY17	TY15,TY16	6	5	12
TY18	TY16,TY17	8	7	15
TY19	TY18	12	10	30
TY20	TY19	5	3	10
TY21	TY20	10	7	30


Διάγραμμα Pert:

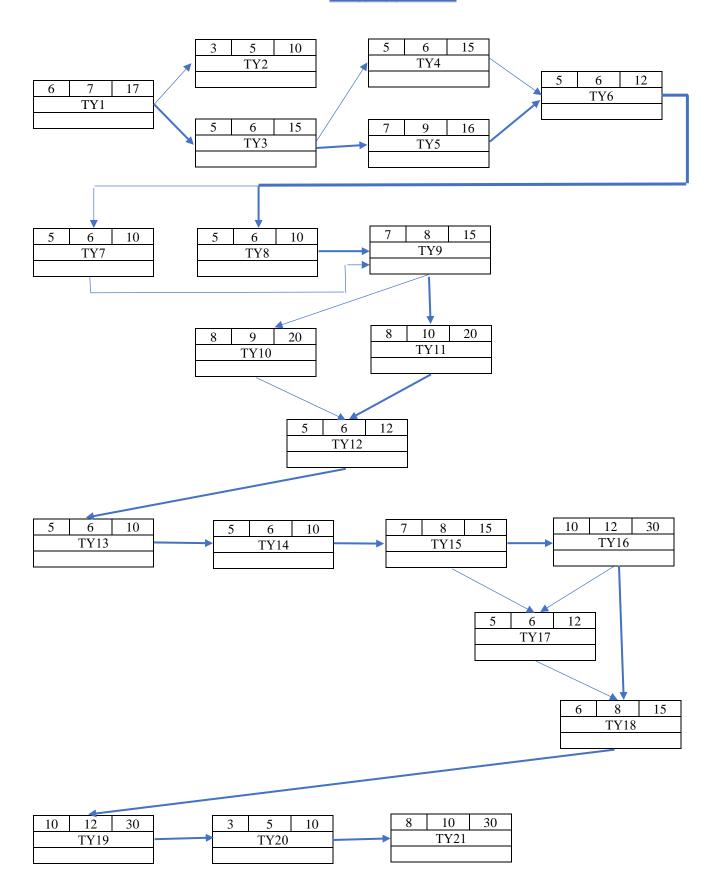

- → Τα μέλη της ομάδας είναι full-committed και στο συνολικό έργο αλλά και στα υποέργα που αναλαμβάνουν στα οποία θα απασχοληθούν από την αρχή μέχρι το τέλος του υποέργου
- → Το έργο αρχίζει την 1/3/22 και υποθέτουμε ότι οι μήνες έχουν διάρκεια 30 ημέρες παραβλέποντας αργίες και σαββατοκύριακα
- → Το κρίσιμο μονοπάτι περιλαμβάνει τα έργα TY1, TY3, TY5, TY6, TY8, TY9, TY11, TY12, TY13, TY14, TY15, TY16, TY18, TY19, TY20, TY21 και έχει συνολική διάρκεια 125 ημέρες. Στο διάγραμμα Pert αναπαριστάνεται με την έντονη μπλέ γραμμή.

Τυπικά Υποέργα	Ανάθεση σε	Χρονική Διάρκεια	Προσπάθεια	Έναρξη	Λήξη
TY1	Α,Β,Γ,Δ	7	35	1/3/22	8/3/22
TY2	Δ,Β	5	35	9/3/22	13/3/22
TY3	Δ,Γ	6	25	9/3/22	14/3/22
TY4	Δ,Γ	6	5	15/3/22	20/3/22
TY5	Δ,Β,Α	9	20	15/3/22	22/3/22
TY6	Α,Β,Γ,Δ	6	35	23/3/22	28/3/22
TY7	Δ,Γ	6	10	29/3/22	3/4/22
TY8	Δ,Α	6	5	4/4/22	9/4/22
TY9	Α,Β,Γ,Δ	8	70	10/4/22	17/4/22
TY10	Α,Β,Γ,Δ	9	70	18/4/22	26/4/22
TY11	Α,Β,Γ,Δ	10	80	18/4/22	27/4/22
TY12	Α,Β,Γ,Δ	6	35	28/4/22	3/5/22
TY13	Δ,Γ	6	35	4/5/22	9/5/22
TY14	Α,Β,Γ,Δ	6	25	10/5/22	15/5/22
TY15	Α,Β,Γ,Δ	8	5	16/5/22	23/5/22
TY16	Α,Β,Γ,Δ	12	20	24/5/22	4/6/22
TY17	Α,Β,Γ,Δ	6	35	24/5/22	29/5/22
TY18	Α,Β,Γ,Δ	8	10	24/5/22	31/5/22
TY19	Α,Β,Γ,Δ	12	5	5/6/22	15/6/22
TY20	Α,Β,Γ,Δ	5	70	16/6/22	20/6/22
TY21	Α,Β,Γ,Δ	10	70	21/6/22	30/6/22

Διάγραμμα Gantt:

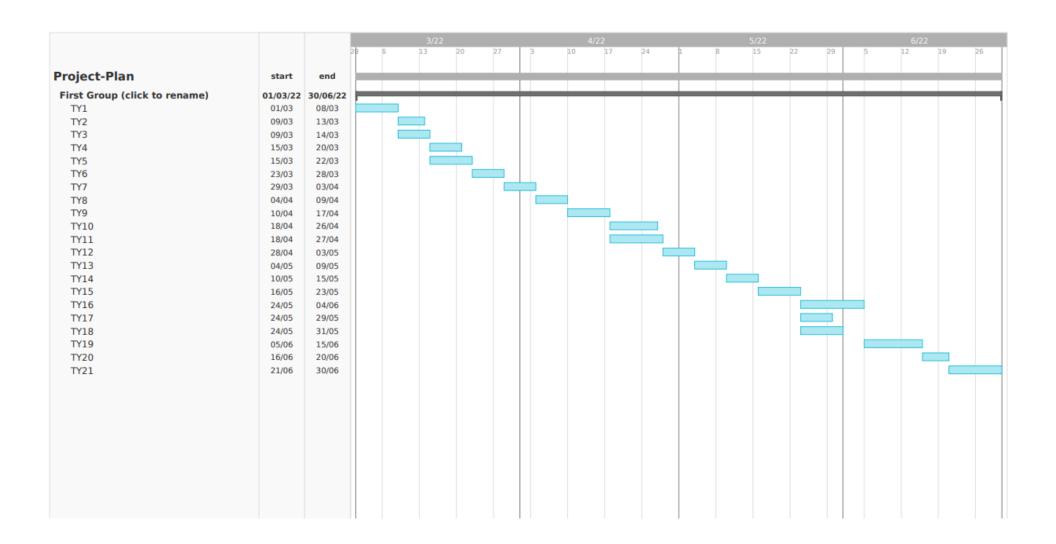

Κόστος Ατόμων Έργου:

Μέλος	TY1	TY2	TY3	TY4	TY5	TY6	TY7	TY8	TY9	TY10	TY11	TY12	TY13	TY14	TY15
A	1,75				3	1,5		3	2	2,25	2,5	1,5		1,5	2
В	1,75	2,5			3	1,5			2	2,25	2,5	1,5		1,5	2
Γ	1,75		3	3		1,5	3		2	2,25	2,5	1,5	3	1,5	2
Δ	1,75	2,5	3	3	3	1,5	3	3	2	2,25	2,5	1,5	3	1,5	2

TY16	TY17	TY18	TY19	TY20	TY21	Ημέρες	Διαθεσ	Μήνες	Κόστος
3	1,5	2	3	1,25	2,5	34,25	100%	1,14	912€
3	1,5	2	3	1,25	2,5	33,75	100%	1,12	896€
3	1,5	2	3	1,25	2,5	40,25	100%	1,34	1072€
3	1,5	2	3	1,25	2,5	48,75	100%	1,62	1296€
